

”Förråd 2019” byggs inom Friluftsförbundets projekt ”Samarbete/Integration”

Friluftsförbundets Projekt ”Samarbete-Integration” tillsammans med Bergska skolans introduktionsprogram har fortsatt även under vintern och våren 2019. Den här gången har vi tillsammans startat och genomfört bygget av ett förråd om 50 kvadratmeter. Arbetet påbörjades i februari genom prefabricering av väggelement och takstolar tillsammans med eleverna och deras lärare Jesper Forsberg som vi också samarbetade med vid bygget av det nya vindsyddet under hösten 2018.

Bygget av förrådet är som ersättning för det som totalförstördes i samband med branden 2003 och skall användas för förvaring av föreningens kajaker/kanoter, annan nödvändig utrustning i verksamheten och skötseln av Luddalen.



Byggleddaren Jan Hellqvist och Jan-Erik Fors vid kapnings och målningsstationen hemma vid Jan-Eriks garage.



Prefabricering av väggelement och



takstolarna vid Bergska skolan

Prefabriceringen påbörjades under tiden som ansökan om strandskyddsdispens och bygglov behandlades vilket naturligtvis var en risk som vi tog medvetna om att tillstånden inte var klara. Orsaken till den tidiga byggstarten var att skolan önskade verkliga projekt samtidigt som föreningen såg en möjlighet att tillsammans förverkliga bygget innan skolan slutade.

Ett för oss omfattande markarbete påbörjades dryga fyra veckor efter godkänd strandskyddsdispens och bygglov, då var vi framme i början av maj. Brorssons Entreprenad tillsammans med Erstorps Grus såg till att underlaget blev som det skulle innan gjutformen kunde sättas på plats.



Brorssons Entreprenad kunde starta 7 maj



Styrelsen börjar se omfattningen
Mikael Strand, Gunni Nilsson, Gunnel Gustafsson
Torbjörn Falkerby, Nils-Olof Persson, Åke Kinnander



Erstorps grus levererar ca 80 m3 kross



J-B Eriksson i formartagen

Den färdiga gjutformen kunde fyllas med betong den 14 maj vilket var en viktig milstolpe i arbetet för att hinna så mycket som möjligt innan skolan börjar sitt sommarlov.



Rännan för cementen räckte precis fram vid gjutningen.



Montering av väggsektioner och takstolar


Nu var det spännande skulle de prefabricerade väggsektionerna och takstolarna passa eller skulle vi behöva några passbitar för att få ihop "pusslet". Allt passade tack vare ett noggrant arbete vid tillverkningen och förberedelserna under ledning av vår byggleddare Jan Hellqvist och vi kunde konstatera att prefabriceringen varit ett lyckodrag i arbetet då hela montaget genomfördes på en dag, den 20 maj.



Undertaket kommer på plats



Nils-Åke och Gunni Nilsson tillsammans med Jan-Erik Fors i arbete med att färdigställa en gavelspets.

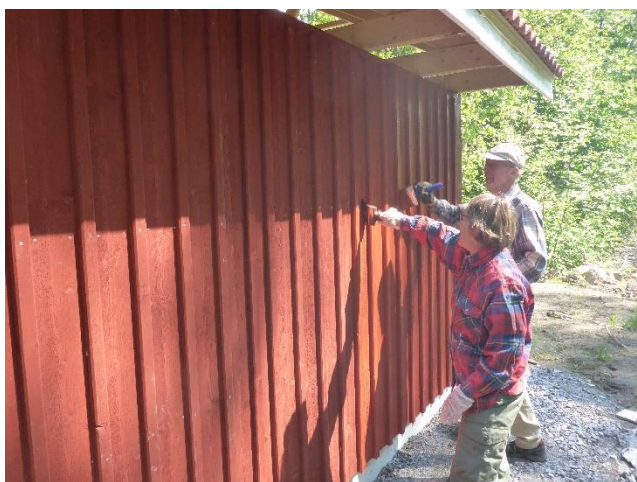

Rödfärgsmålarna Gunni Nilsson och Åke Kinnander i farten.



Jan Hellqvist och Jan-Erik Fors – Konstaterar nöjt att det blev ett mycket fint bygge till stor nytta för föreningen

En viktig extra insats för att få ett vädertätt bygge så snabbt som möjligt gjordes av några elever på Bergska gymnasiet byggprogram vilka deltog i slutmontaget av väggelementen och en snabb utläggning av nära 800 takpannor.

Målsättningen att vara klara till skolan slutade klarades i stort sett medan en del mindre byggarbeten och färdigmålning avslutades lagom till midsommar. Naturligtvis firades också bygget, i det här fallet med en senarelagd taklagsfest i form av grillkväll den 16 juni med alla inbjudna inbjudan.

I slutskedet av projektet har vi beslutat att vi som en extra investering för framtiden skall gjuta ett golv istället för det ursprungligen tänkta gruset. Detta har många fördelar och kommer nu att göras innan förrådet börjar användas. Arbetet planeras nu ske i augusti liksom slutmontaget av förrådsportarna.

”Förråd 2019” hade inte varit möjligt att genomföra med det resultat vi nu ser utan det goda samarbetet i projektet ”Samarbete/Integration” och stöttnen från direkt inblandade företag; XL-bygg Finspång, Borssons Entreprenad, Erstorps Grus/Sonstorps Åkeri, Garageportexperten, Tholmarks, Hävla Bruk, Azimut AB - Lars-Erik Källgren, Finspångs Tekniska Verk AB, Finspångs kommun men också de företag som föreningen sedan tidigare har ett gott samarbete med, Gränges, Siemens, Vallonbygden, Finspångs Brunnsborrning, Coop Finspång, Colorama Ödmans.

Många har mötts och samtidigt lärt sig mycket nytt under hela genomförande vilket också är ett av huvudsyftena i projektet ”Samarbete/Integration”.

Golvet är nu gjutet, portarna på plats och vi kan konstatera att den totala arbetstiden är 1200 – 1300 timmar från ide till färdigt bygge. Om vi bortser från de förbättrande åtgärder som beslutats under projektets gång (framförallt gjutning av kantbalk och golv) så har ursprungskalkylen varit möjlig att hålla med en mindre avvikelse.



Nils-Åke Nilsson och Jens Rinman rengör "slodan" efter utjämning av golvets 4 kubikmeter betong den 14 augusti



Förberedelse för portmontage. Nils-Åke Nilsson i blandartagen medan eleverna gjuter tröskeln under överinseende av Jan Hellqvist.



2019-09-06 Resultatet av projektet "Förråd 2019" inom vårt "Samarbete/Integration" tillsammans med Bergska gymnasiets introduktions program. Utan alla dessa gemensamma insatser på olika sätt hade vi inte haft möjlighet att genomföra detta projekt. Stort tack till alla inblandade – Styrelsen

För att få ett ännu mer ändamålsenligt förråd har styrelsen tagit beslut att även investera i invändig och utvändigt belysning vilken kommer att vara idrift 2020.



Finspångs Lokalavdelning

www.friluftsframjandet.se/finspang
